


MNCARS

PLANTA 2

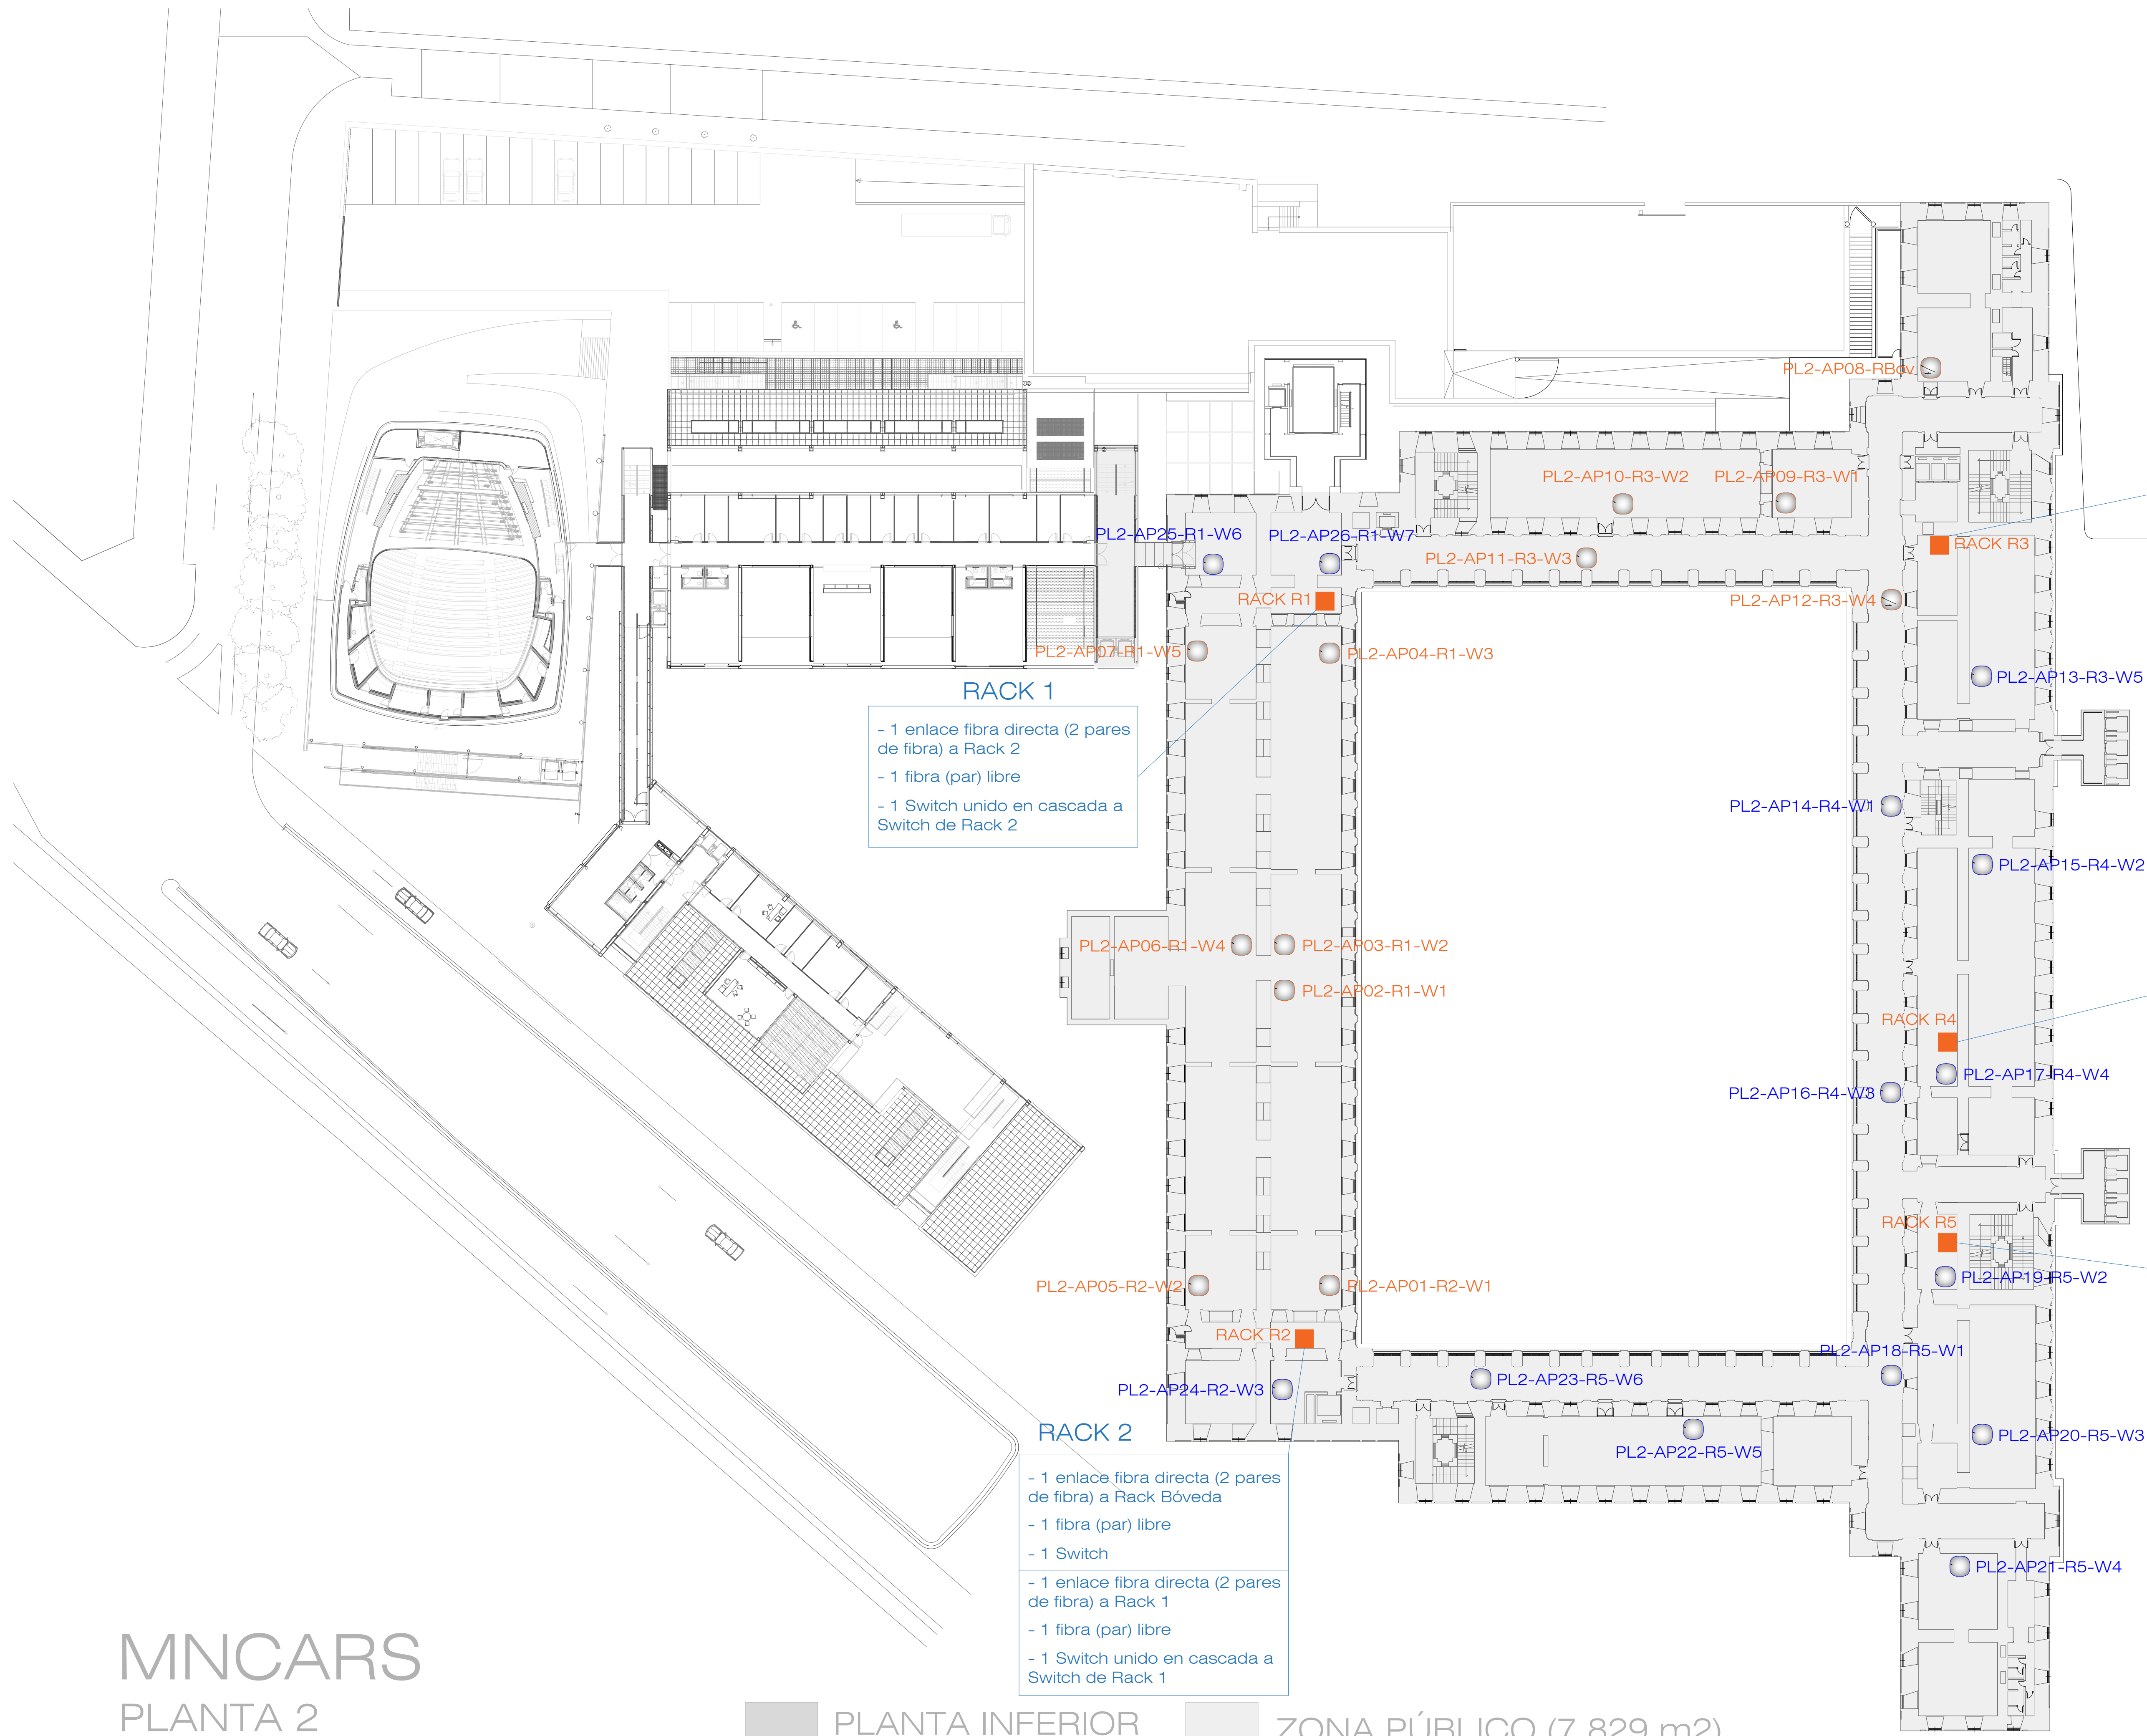

RACK 1

- 1 enlace fibra directa (2 pares de fibra) a Rack 2
- 1 fibra (par) libre
- 1 Switch unido en cascada a Switch de Rack 2

RACK 2

- 1 enlace fibra directa (2 pares de fibra) a Rack Bóveda
- 1 fibra (par) libre
- 1 Switch
- 1 enlace fibra directa (2 pares de fibra) a Rack 1
- 1 fibra (par) libre
- 1 Switch unido en cascada a Switch de Rack 1

RACK 3

- 1 enlace fibra directa (2 pares de fibra) a Rack Bóveda
- 1 fibra (par) libre
- 1 Switch

RACK 4

- 1 enlace fibra directa (2 pares de fibra) a Rack Bóveda
- 1 fibra (par) libre
- 1 Switch

RACK 5

- 1 enlace fibra directa (2 pares de fibra) a Rack Bóveda
- 1 fibra (par) libre
- 1 Switch
